

**ОТЧЕТ**  
**о выполнении условий финансирования расходов**  
**при реализации проекта инициативного бюджетирования**

Устройство детской игровой площадки «Семицветик» в с. Суда  
 (наименование проекта)

Уинский муниципальный округ  
 (наименование муниципального образования)

Всего	Предусмотрено проектом в соответствии с соглашением, руб.					Стоимость заключенных муниципальных контрактов, договоров, соглашений, руб.	Подлежит перечислению из средств бюджета Пермского края, руб.	Поступило средств из бюджета Пермского края в текущем году, руб.	Остаток не использованных в текущем году средств, руб.
	2	3	4	5	6				
	в том числе:								
	средства бюджета Пермского края	средства бюджета муниципального образования, за исключением инициативных платежей	денежные средства граждан	денежные средства индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц					
1 = 2 + 3 + 4 + 5	2	3	4	5	6	7 = 2 - 8 - 9	8	9 = 1 - 6	

598 919,03	400 009,50	139 017,63	59 891,90	0,00	598 919,03	400 009,50	0,00	0,00
------------	------------	------------	-----------	------	------------	------------	------	------




Глава муниципального округа –  
глава администрации Уинского муниципального округа

  
(подпись)

/А.Н. Зелёнкин /  
(ФИО)

МП

Начальник финансового управления  
администрации Уинского муниципального округа

  
(подпись) /Л.А. Хомякова /  
(ФИО)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

Отметка о дате предоставления отчета в Министерство территориального развития Пермского края: « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

ПРОВЕРЕН:

\_\_\_\_\_  
(должность ответственного лица) (подпись) (ФИО)

заместитель начальника управления, начальник отдела  
поддержки общественного самоуправления управления  
поддержки местных инициатив и правовой работы  
Министерства территориального развития Пермского края

ПРИНЯТ:

\_\_\_\_\_  
(должность ответственного лица) (подпись) (ФИО)  
/ Аристова Е.Н. /  
(ФИО)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

Выписка  
из приложения 3 к решению Думы Уинского  
муниципального округа от 12.12.2024 № 35 «О бюджете  
Уинского муниципального округа Пермского края на 2025  
год и на плановый период 2026 и 2027 годов»

**Ведомственная структура расходов бюджета на 2025 год**

Административные группы	Раздел, подраздел	ЦСР	ВР	Наименование	2025 (руб.)
1	2	3	4	5	6
807				<b>УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ</b>	<b>250 288 592,37</b>
	07.00			ОБРАЗОВАНИЕ	240 012 121,37
	07.01			Дошкольное образование	58 388 338,64
	07.01	32.1.05.00000		Основное мероприятие "Реализация проекта инициативного бюджетирования "	1 291 786,03
	07.01	32.1.05.SP080		Реализация проекта инициативного бюджетирования	1 291 786,03
	07.01	32.1.05.SP080	6.0.0	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1 291 786,03
	07.01	32.1.05.SP080		Устройство детской игровой площадки «Семицветик» в с. Суда (средства местного бюджета)	139 017,63
	07.01	32.1.05.SP080		Устройство детской игровой площадки «Семицветик» в с. Суда (средства краевого бюджета)	400 009,50
	07.01	32.1.05.SP080		Устройство детской игровой площадки «Семицветик» в с. Суда (средства населения)	59 891,90

Председатель Думы  
Уинского муниципального округа  
06.03.2025



Н.А. Гладких

04.03.2025

Поступ. в банк плат.

04.03.2025

Списано со сч. плат.

040

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 192396

04.03.2025

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Десять рублей 00 копеек

ИНН 7707083893	КПП 526002001	Сумма	10-00		
ПАО СБЕРБАНК		Сч. №	30233810642000600001		
Плательщик		БИК	042202603		
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород		Сч. №	30101810900000000603		
Банк плательщика		БИК	015773997		
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ/УФК по Пермскому краю, г Пермь		Сч. №	40102810145370000048		
Банк получателя		Сч. №	03100643000000015600		
ИНН 5917006027	КПП 591701001	Вид оп.	01	Срок плат.	5
УФК по Пермскому краю (Управление образования администрации Уинского муниципального округа Пермского края, л/с 04563298720)		Наз.пл.		Очер. плат.	
		Код	0	Рез. поле	
Получатель	80711715020140002150	57552000	0	0	0
			0	0	0

ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 03/03/2025 ПО 03/03/2025 НА ОБЩУЮ СУММУ 10.00, В Т.Ч. УСЛ. БАНКА: 0.00, В КОЛ-ВЕ 1, СОГЛАСНО ЭЛ. РЕЕСТРУ  
EPS831295121021\_490020\_8957518217\_5917006027\_03100643000000015600\_542.txt

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Управление Федерального казначейства по  
Пермскому краю

04.03.2025

ПРОВЕДЕНО

Бояршинова Марина Владимировна



ВЕРНО  
НАЧАЛЬНИК  
ФИНАНСОВОГО  
УПРАВЛЕНИЯ

*Л.А. Хомякова*  
Л.А. ХОМЯКОВА

07.03.2025

Поступ. в банк плат.

07.03.2025

Списано со сч. плат.



ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 207108

07.03.2025

Дата

Вид платежа

15

Сумма  
прописью

Двадцать тысяч семьсот рублей 00 копеек

ИНН 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	КПП 526002001	Сумма	20700-00		
		Сч. №	30233810642000600001		
<b>Плательщик</b> ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород		БИК	042202603		
		Сч. №	30101810900000000603		
<b>Банк плательщика</b> ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ/УФК по Пермскому краю, г Пермь		БИК	015773997		
		Сч. №	40102810145370000048		
<b>Банк получателя</b> ИНН 5917006027 КПП 591701001 УФК по Пермскому краю (Управление образования администрации Уинского муниципального округа Пермского края, л/с 04563298720)		Сч. №	03100643000000015600		
		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	5
<b>Получатель</b> 80711715020140002150 57552000 0 0 0 0 0		Код	0	Рез. поле	

ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 06/03/2025 ПО 06/03/2025 НА ОБЩУЮ СУММУ 20700.00,В  
Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕВЕСТРУ  
EPS831295121021\_490020\_8957518217\_5917006027\_03100643000000015600\_546.txt

Назначение платежа

Подпись

Отметки банка

М. П.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Управление Федерального казначейства по  
Пермскому краю  
07.03.2025  
ПРОВЕДЕНО  
Бояршинова Марина Владимировна



ВЕРНО  
НАЧАЛЬНИК  
ФИНАНСОВОГО  
УПРАВЛЕНИЯ  
*Л.А.ХОМЯКОВА*

10.03.2025

Поступ. в банк плат.

10.03.2025

Считано со сч. плат.

04С

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 758917

10.03.2025

Дата

Вид платежа

15

Сумма прописью	Одна тысяча сто рублей 00 копеек						
ИНН 7707083893	КПП 526002001			Сумма	1100-00		
ПАО СБЕРБАНК				Сч. №	30233810642000600001		
Плательщик				БИК	042202603		
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород				Сч. №	30101810900000000603		
Банк плательщика				БИК	015773997		
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю, г Пермь				Сч. №	40102810145370000048		
Банк получателя				Сч. №	03100643000000015600		
ИНН 5917006027		КПП 591701001		Вид оп.	01	Срок плат.	5
УФК по Пермскому краю (Управление образования администрации Уинского муниципального округа Пермского края, л/с 04563298720)				Наз. пл.		Очер. плат.	
				Код	0	Рез. поле	
Получатель							
80711715020140002150		57552000		0	0	0	0
ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 07/03/2025 ПО 07/03/2025 НА ОБЩУЮ СУММУ 1100.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS831295121021_490020_8957518217_5917006027_03100643000000015600_548.txt							

Назначение платежа

Подпись

Отметки банка

М. П.

Управление Федерального казначейства по  
Пермскому краю

10.03.2025

ПРОВЕДЕНО

Бояршинова Марина Владимировна



ВЕРНО  
НАЧАЛЬНИК  
ФИНАНСОВОГО  
УПРАВЛЕНИЯ  
Л.А.ХОМЯКОВА

11.03.2025

Поступ. в банк плат.

11.03.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 274717

11.03.2025

Дата

Вид платежа

15

Сумма  
прописью

Двадцать семь тысяч девятьсот рублей 00 копеек

ИНН 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	КПП 526002001	Сумма	27900-00		
		Сч. №	30233810642000600001		
Плательщик ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород		БИК	042202603		
		Сч. №	30101810900000000603		
Банк плательщика ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю, г Пермь		БИК	015773997		
		Сч. №	40102810145370000048		
Банк получателя ИНН 5917006027 УФК по Пермскому краю (Управление образования администрации Уинского муниципального округа Пермского края, л/с 04563298720)		КПП 591701001	Сч. №	03100643000000015600	
		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	5
		Код	0	Рез. поле	
Получатель	80711715020140002150	57552000	0	0	0

ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 10/03/2025 ПО 10/03/2025 НА ОБЩУЮ СУММУ 27900.00,В  
Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 3,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ  
EPS831295121021\_490020\_8957518217\_5917006027\_03100643000000015600\_550.txt

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка


М. П.

Управление Федерального казначейства по  
Пермскому краю

11.03.2025

ПРОВЕДЕНО

Бояршинова Марина Владимировна



ВЕРНО  
НАЧАЛЬНИК  
ФИНАНСОВОГО  
УПРАВЛЕНИЯ  
И.А. КОМЯКОВА

12.03.2025

Поступ. в банк плат.

12.03.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 215450

12.03.2025

Дата

Вид платежа

15

Сумма прописью Одна тысяча шестьсот рублей 00 копеек

ИНН 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	КПП 526002001	Сумма	1600-00		
		Сч. №	30233810642000600001		
Платательщик ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород		БИК	042202603		
		Сч. №	301018109000000000603		
Банк плательщика ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю, г Пермь		БИК	015773997		
		Сч. №	40102810145370000048		
Банк получателя ИНН 5917006027 КПП 591701001		Сч. №	03100643000000015600		
УФК по Пермскому краю (Управление образования администрации Уинского муниципального округа Пермского края, л/с 04563298720)		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз.пл.		Очер. плат.	5
		Код	0	Рез. поле	
Получатель	80711715020140002150	57552000	0	0	0

ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 11/03/2025 ПО 11/03/2025 НА ОБЩУЮ СУММУ 1600.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS831295121021\_490020\_8957518217\_5917006027\_03100643000000015600\_553.txt

Назначение платежа

Подпись

Отметки банка

М. П.

Управление Федерального казначейства по  
Пермскому краю  
12.03.2025  
**ПРОВЕДЕНО**  
Бояршинова Марина Владимировна



ВЕРНО  
НАЧАЛЬНИК  
ФИНАНСОВОГО  
УПРАВЛЕНИЯ  
*Л.А. ХОМЯКОВА*

21.03.2025

Поступ. в банк плат.

21.03.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 198989

21.03.2025

Дата

Вид платежа

15

Сумма  
прописью Две тысячи рублей 00 копеек

ИНН 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	КПП 526002001	Сумма	2000-00		
		Сч. №	30233810642000600001		
Платательщик ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород		БИК	042202603		
		Сч. №	30101810900000000603		
Банк плательщика ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю, г Пермь		БИК	015773997		
		Сч. №	40102810145370000048		
Банк получателя ИНН 5917006027 КПП 591701001 УФК по Пермскому краю (Управление образования администрации Уинского муниципального округа Пермского края, л/с 04563298720)		Сч. №	03100643000000015600		
		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	5
		Код	0	Рез. поле	
Получатель	80711715020140002150	57552000	0	0	0

ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 20/03/2025 ПО 20/03/2025 НА ОБЩУЮ СУММУ 2000.00,В  
Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ  
EPS831295121021\_490020\_8957518217\_5917006027\_03100643000000015600\_562.txt

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка


М. П.

Управление Федерального казначейства по  
Пермскому краю

21.03.2025

ПРОВЕДЕНО

Бояршинова Марина Владимировна



ВЕРНО  
НАЧАЛЬНИК  
ФИНАНСОВОГО  
УПРАВЛЕНИЯ  
*Л.А. Хомякова* Л.А. ХОМЯКОВА

28.03.2025

Поступ. в банк плат.

28.03.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 147815

28.03.2025

Дата

Вид платежа

15

Сумма  
прописью

Шесть тысяч пятьсот восемьдесят один рубль 90 копеек

ИНН 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	КПП 526002001	Сумма	6581-90		
		Сч. №	30233810642000600001		
Платательщик ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород		БИК	042202603		
		Сч. №	30101810900000000603		
Банк плательщика ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю, г Пермь		БИК	015773997		
		Сч. №	40102810145370000048		
Банк получателя ИНН 5917006027 КПП 591701001		Сч. №	03100643000000015600		
УФК по Пермскому краю (Управление образования администрации Уинского муниципального округа Пермского края, л/с 04563298720)		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз.пл.		Очер. плат.	5
		Код	0	Рез. поле	
Получатель	80711715020140002150	57552000	0	0	0

ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 27/03/2025 ПО 27/03/2025 НА ОБЩУЮ СУММУ 6581.90,В  
Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ  
EPS831295121021\_490020\_8957518217\_5917006027\_03100643000000015600\_569.txt

Назначение платежа

Подпись

Отметки банка

М. П.

Управление Федерального казначейства по  
Пермскому краю

28.03.2025

ПРОВЕДЕНО

Гумарова Лариса Ромировна



ВЕРНО  
НАЧАЛЬНИК  
ФИНАНСОВОГО  
УПРАВЛЕНИЯ  
Л.А.ХОМЯКОВА



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
ПЕРМСКОГО КРАЯ**

Ул. Октябрьская, д. 1, с. Уинское,  
Пермский край, Уинский район, 617520  
Тел. (259) 2 31 62, факс (259) 2 42 99  
administration@uinsk.permkrai.ru, КПП 591701001

ОГРН 1205900003605, ИНН 5917005961

08.04.2025 № 259-01-03-15исх-164

Министру территориального  
развития Пермского края

Усачевой С.В.

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Пояснительная записка к платежам  
по проекту инициативного  
бюджетирования**

Уважаемая Светлана Викторовна!

Администрация Уинского муниципального округа Пермского края поясняет, что средства, поступившие по платежным поручениям:

от 04.03.2025 №192396 от ПАО «Сбербанк» сумме 10 (десять) рублей 00 копеек,

от 07.03.2025 №207108 от ПАО «Сбербанк» сумме 20700 (двадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек,

от 10.03.2025 №758917 от ПАО «Сбербанк» сумме 1100 (одна тысяча сто) рублей 00 копеек,

от 11.03.2025 №274717 от ПАО «Сбербанк» сумме 27900 (двадцать семь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек,

от 12.03.2025 №215450 от ПАО «Сбербанк» сумме 1600 (одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек,

от 21.03.2025 №198989 от ПАО «Сбербанк» сумме 2000 (две тысячи) рублей 00 копеек,

от 28.03.2025 №147815 от ПАО «Сбербанк» сумме 6581 (шесть тысяч пятьсот восемьдесят один) рубль 90 копеек,

являются денежными средствами граждан по проекту инициативного бюджетирования «Устройство детской игровой площадки «Семицветик» в с. Суда».

Глава муниципального округа –  
глава администрации Уинского  
муниципального округа



А.Н. Зелёнкин

Николаева Наталья Александровна  
8(342)5923645

## Договор подряда №01

г.Пермь

« 06 » февраля 2025 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Судинская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Судинская СОШ»), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Вороной Ольги Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Мир Авто» (ООО «Мир Авто»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице директора Плотникова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы «Устройство детской игровой площадки «Семицветик» в с.Суда» в соответствии с локальным-сметным расчетом, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые для выполнения работ условия, принять их результат и уплатить согласованную сторонами цену.

1.2. Сроки выполнения работ по договору: с 01.06.2025 г. по 20.06.2025 г.

1.3. Стоимость работ выполняемых по настоящему договору составляет 598919 (Пятьсот девяносто восемь тысяч девятьсот девятнадцать) рублей 03 копейки, без НДС.

1.4. ИКЗ: 253595300230059510100100010000000244.

1.5. Источник финансирования: Средства бюджетного учреждения ПФХД – Субсидии на иные цели - услуги, работы для целей капитальных вложений.

### 2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Застраховать риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, материалов, оборудования и другого имущества.

2.1.2. Осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с локальным-сметным расчетом с соблюдением строительных норм и правил / СН и ПОВ/.

2.1.3. Обеспечивать строительство материалами, в том числе деталями, конструкциями и оборудованием, которые должны соответствовать действующим ГОСТам и санитарно-гигиеническим нормам, что должно быть документально подтверждено.

2.1.4. Исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора и не представляют собой вмешательства в оперативно – хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.1.5. Соблюдать требования законов и других нормативно-правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности выполняемых работ.

2.2. Подрядчик вправе:

2.2.1. Требовать возмещения разумных расходов, которые нанесены ему в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. При обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за выполнением работ отступлений от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, немедленно заявить об этом Подрядчику.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно – хозяйственную деятельность Подрядчика.



### 3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Подрядчик предоставляет Заказчику в течение одного рабочего дня после выполнения работ счет, счет-фактуру (при наличии), УПД, акт приемки выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), исполнительную документацию.

3.2. Форма оплаты: оплата производится денежными средствами путем перечисления на расчетный счет Подрядчика в течении 7 (Семи) рабочих дней со дня подписания акта приемки выполненных работ.

### 4. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

4.1. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по настоящему договору работ, обязан не позднее семидневного срока приступить к их приемке.

4.2. Заказчик организует и осуществляет приемку результата работ за свой счет.

4.3. Сдача результата работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляется Актом о приемке выполненных работ, подписываемым сторонами настоящего договора. При отказе одной из сторон от подписания акта, в нем делается пометка об этом, и акт подписывается другой стороной.

4.4. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работы в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования по назначению и не могут быть устранены Подрядчиком.

### 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Подрядчик гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта на протяжении следующего гарантийного срока 24 (двадцать четыре) месяца со дня приемки Объекта комиссией в установленном порядке.

5.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

5.3. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства РФ.

5.4. Договор составлен в 2-х экземплярах - по одному для каждой стороны

### 6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

**МБОУ «Судинская СОШ»**

617535, Пермский край, Уинский район, с.Суда,  
ул. Центральная, 29

ИНН 5953002300 КПП 595101001

ОГРН 1025902545900

Казначейский счет 03234643575520005600

БИК ТОФК 015773997

Наименование банка получателя: ОТДЕЛЕНИЕ  
ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ // УФК по Пермскому  
краю г. Пермь

ЕКС 40102810145370000048

Тел. 8(342)5903-13-98

Эл. адрес: udaschool@yandex.ru

Подрядчик:

**ООО «Мир Авто»**

6140083, г.Пермь. ул.Холмогорская, д.4в,  
кв199.

ИНН/КПП 5904235830/590401001

ОГРН 1105904014040

р/с 40702810549500044202 в Волго-Вятском  
банке ПАО Сбербанк

к/с 30101810900000000603

БИК 042202603

Е-mail: Miravto59@yandex.ru



О.Н.Воронина



А.Н.Плотников

### Техническое задание

#### 1. Общая информация об объекте закупки

1.1. Наименование объекта закупки: Устройство детской игровой площадки «Семицветик» в с.Суда

1.2. Срок выполнения работ.

1.2.1. Срок начала выполнения работ: 01.06.2025 г.

1.2.2. Срок окончания выполнения работ: 20.06.2025 г.

1.3. Место выполнения работ: Пермский край, Уинский район, с.Суда, ул. Центральная, 22

#### 2. Требования к качеству работ

2.1. Работы должны выполняться в соответствии с:

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

При проведении строительных работ следует осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей природной среды в соответствии с требованиями СП 115.13330.2016

Геофизика опасных природных воздействий; СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения; СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Все применяемые материалы для производства работ должны быть сертифицированы и соответствовать ГОСТам.

Иными нормативно-правовыми и локальными актами, применяемыми в указанной сфере.

Подрядчик несет ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда на своих рабочих участках, за соблюдение персоналом правил и инструкций по охране труда, за выполнение предусмотренных мер безопасности.

2.2. Работы выполняются с применением материалов Подрядчика.

2.3. Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, иметь соответствующие технические паспорта, техническую и эксплуатационную документацию на русском языке, гарантийные талоны (на оборудование), сертификаты о соответствии (декларации соответствия), пожарные сертификаты, и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, используемого при выполнении работ. Подрядчик обеспечивает контроль за качеством используемых материалов и несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования.

2.4. Производственный контроль качества работ должен включать входной контроль материалов и оборудования, операционный контроль отдельных процессов или производственных операций и приемочный контроль выполненных работ.

#### 3. Порядок выполнения работ

3.1. До начала выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику копию приказа о назначении лица, ответственного за выполнение работ на Объекте, с указанием предоставляемых ему полномочий (включая право подписания и согласования журналов выполненных работ, документов о приемке выполненных работ (актов).

3.2. Подрядчик осуществляет обеспечение контроля за качеством выполнения работ.

3.3. Подрядчик обязан обеспечить допуск к выполнению работ рабочих, прошедших вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте.


3.4. Подрядчик за свой счет устанавливает паспорт объекта (Заказчик, Подрядчик, сроки выполнения работ, ответственные лица).

3.5. Подрядчик обязан регулярно производить очистку территории от строительного мусора, образующегося в процессе выполнения работ. До подписания документа о приемке объекта Подрядчик должен вывезти за территорию Объекта принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструмент и другое имущество, а также строительный мусор. Произвести после сдачи объекта демонтаж паспорта объекта.

3.6. Подрядчик обязан обеспечить проведение мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций (использовать оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора).

3.7. Подрядчик обязан обеспечить Объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью выполнения работ в установленные сроки.

3.8. Работы должны выполняться в условиях действующей организации Заказчика без остановки деятельности организации Заказчика, с соблюдением правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций в присутствии ответственных



представителей учреждения».

3.9. Весь строительный мусор должен быть вывезен на полигон ТБО.

3.10. Подрядчик должен обеспечить сохранность имущества, строительных материалов и т.д.

4. Требования к результатам работ

4.1. Результат выполненных работ должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в настоящем Техническом задании, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного настоящим Техническим заданием использования.

4.2. Подрядчик предоставляет Заказчику в течение одного рабочего дня после выполнения работ счет, счет-фактуру (при наличии), УПД, акт приемки выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), исполнительную документацию.

4.3. Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования Объекта, в том числе до приемки выполненных работ, передать Заказчику исполнительную документацию:

общий журнал работ;

журнал входного контроля материалов;

акты на скрытые работы.

4.4. Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет 5 лет со дня подписания Заказчиком документа о приемке. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения Заказчик проводит за счет Подрядчика квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд.

4.5. Все содержащиеся в техническом задании (проектной документации, локально-сметном расчете, ведомостях объемов работ) товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность (аналогичность) материалов (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Приложения к техническому заданию:

Приложение №1 - Ведомость объемов работ



" \_\_\_\_ " февраля 2025 г.

## Ведомость объёмов работ

по объекту: Устройство детской игровой площадки «Семицветик» в с. Суда

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
<b>Раздел 1. Благоустройство спортивно-игровой площадки</b>						
<b>Подготовительные работы</b>						
1	1	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м <sup>2</sup>	0,4		(20*20) / 1000
<b>Бордюр и отсыпка</b>						
2	2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,6		(15*4) / 100
3	3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований: из песка	100 м <sup>3</sup>	0,45		(15*15*0,20) / 100
4	4	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: в "обойме"	1000 м <sup>2</sup>	0,225		225 / 1000
<b>Установка МАФ и оборудования</b>						
5	5	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание/применительно монтажа оборудования	100 шт	0,28		28 / 100
6	6	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др./применительно монтажа МАФ (лавочки)	100 шт	0,02		2 / 100


Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: начальник МКУ "УКС и ЖКХ"

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]





## Дизайн-проект

«Устройство детской игровой площадки в с. Суда».


Адрес объекта: Пермский край, Уинский округ, с. Суда,  
ул. Центральная, вблизи д.22



с. Уинское, Пермский край, 2024 г.



План обустройства детской площадки.  
Нермский край, Уинский округ, с. Сула, ул. Центральная, вблизи д.22

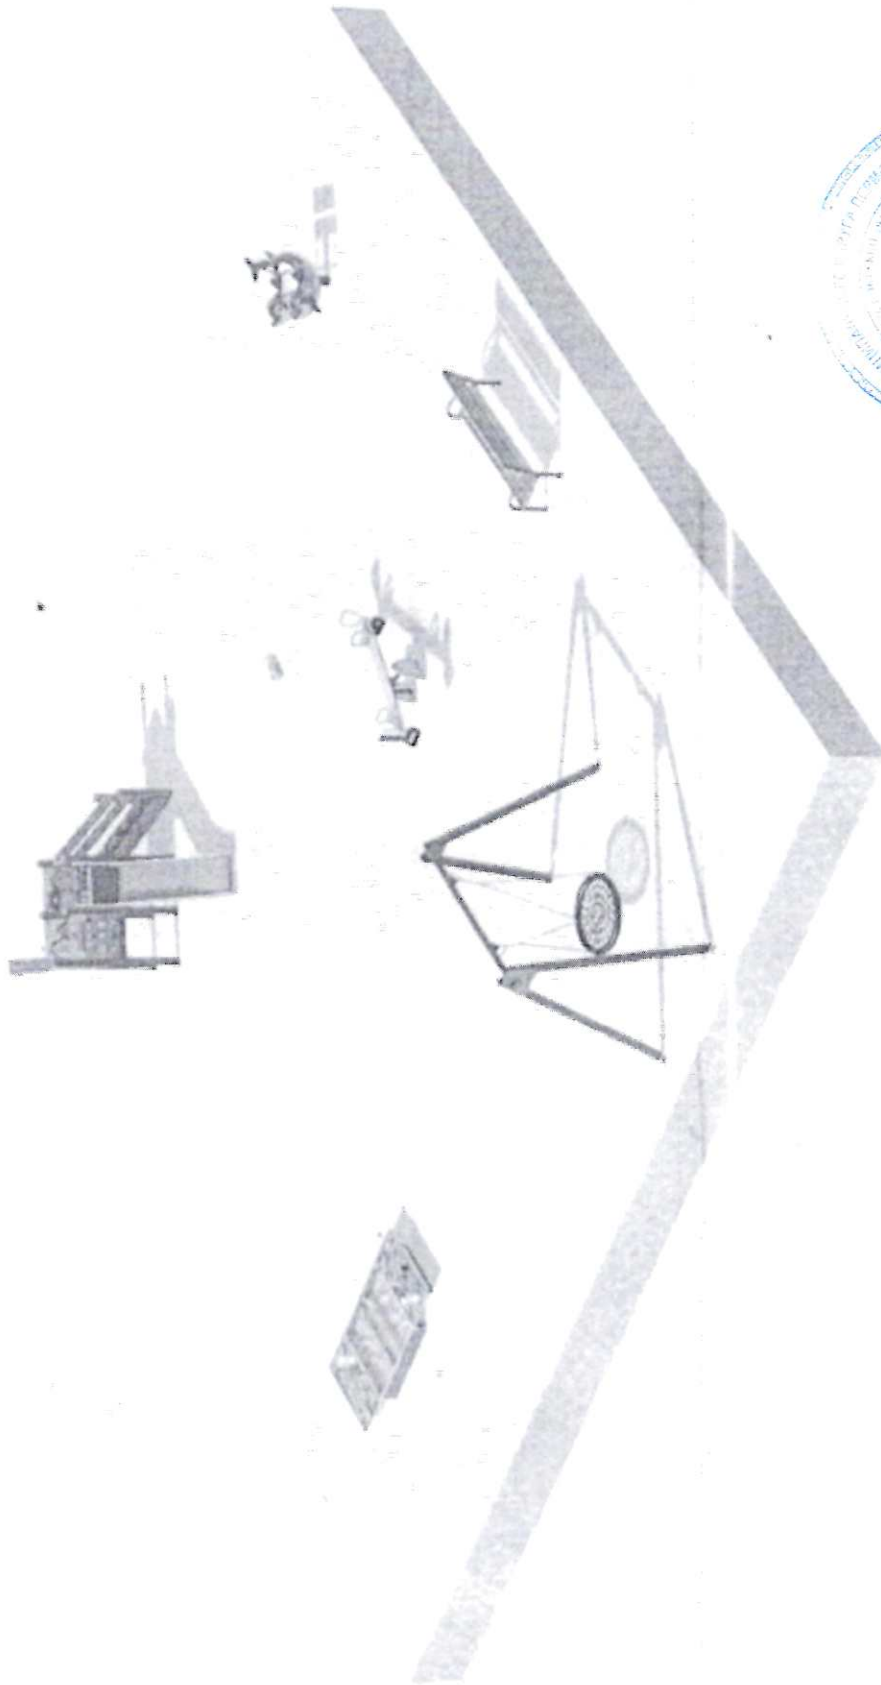

КОПИИ ВЕРНА  
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА -  
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УИНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
А.Н. Зелёнкин 202 г.



Экспликация

№ п.п.	Наименование	Характеристики	Примечания
1	Планировка территории площадки	Размер 20х20 м.п.	Срезка растительного слоя и выравнивание.
2	Установкой бордюра	60 м.п.	По периметру
3	Отсыпка площадки песком (с укладкой геотекстиля)	15х15 м.п.	Покрытие площадки
4	Песочница	По согласованию	1 шт.
5	Горка детская	По согласованию	1 шт.
6	Качели «Гнездо»	По согласованию	1 шт.
7	Скамья парковая	По согласованию	1 шт.
8	Качели балансир	По согласованию	1 шт.
9	Качели на пружине	По согласованию	1 шт.



Приложение № 3  
Утверждено приказом Министра строительства Пермского края от 26.07.2022 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.



УТВЕРЖДАЮ:

О.Н. Доронича

12 февраля 2025 года

ГРАНД-Смета, версия 2024.2

Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/пр. Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр. Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр. Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр. Приказ Министра России от 02.05.2024 № 551/пр. Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр. Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр. Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 278/пр. Приказ Министра России от 26 августа 2022 г. № 703/пр. Приказ Министра России от 26 октября 2022 г. № 935/пр. Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр. Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр. Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/пр. Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр. Приказ Министра России от 02.03.2021 № 636/пр. Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр. Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр. Приказ Министра России от 02.08.2023 № 351/пр. Приказ Министра России от 14.11.2023 № 617/пр. Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр.

Письмо Министра России от 22.02.2024 № 10056-ИФ/081

Приказ Министерства строительства Пермского края от 28.02.2023 № 35-01-12-42

30, Пермский край

Пермский край

(наименование стройки)



(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Устройство детской игровой площадки «Самыетики» в с. Судя  
(наименование работ и затрат)

Составлен	ресурсно-индексным	методом
Основание	(применяется и (или) иные методические документы)	
Составлен(а) в текущем уровне цен	1 квартал 2024 года	
Заметная стоимость	593,91503 тыс руб.	
в том числе:		
строительных работ	489,10 тыс руб.	
монтажных работ	0,00 тыс руб.	
оборудования	0,00 тыс руб.	
прочих затрат	0,00 тыс руб.	

Средства на оплату труда рабочих  
Средства на оплату труда машинистов  
Нормативные затраты труда рабочих  
Нормативные затраты труда машинистов



Директор «Пермского Авто»

ПАСОЕАНО

г. Пермь

2025 года

Сметчик

Сметчик

Сметчик

Сметчик

Результаты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Результаты письма Министра России об индексации стоимости сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленные в соответствии с пунктом 65 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2016 г. № 323/пр

Результаты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утвержденный в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации


Наименование зоны субъекта Российской Федерации

№ п/п	Основание	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество					Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>Раздел 1 Благоустройство спортивно-игровой площадки</b>													
<b>Подготовительные работы</b>													
1	ГЭСН01-02-027-02	Планировка площадок: механирированным способом, группа грунтов 2	1000 м2	0,4	1	0,4							
	2 ЭМ										507,48		
		ОТМ(ЗТм)	чел-ч	0,386		0,386					177,44		
		91 01 01-035 Бульдозеры, мощность 75 кВт (108 л.с.)	маш.час	0,244		0,244			1 092,00		266,45		
		4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел-ч	0,61		0,244			448,07		109,33		
		91 01 02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 89 кВт (135 л.с.)	маш.час	0,38		0,152		1,289,64			241,01		
		4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел-ч	0,38		0,152			448,07		68,11		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 288,93</b>		<b>815,57</b>		
<b>Бордюр и отсыпка</b>													
2	ГЭСН27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных, при других видах покрытий	100 м	0,6	1	0,6							
		1 ОТ(ЗТ)	чел-ч	41,88		41,88					12 301,85		
		1-100-29 Средний разряд работы 2,9	чел-ч	69,8		41,88			293,74		12 301,83		
		2 ЭМ									566,84		
		ОТМ(ЗТм)	чел-ч	0,38		0,38					172,00		
		91 05 05-015 Крыны на автомобильном ходу, грузоподъемность 76 т	маш.час	0,366		0,366			1 512,19		553,46		
		4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел-ч	0,61		0,366			448,07		163,63		
		91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,024			557,37		13,38		
		4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел-ч	0,04		0,024			333,57		8,01		
		4 М									19 766,35		
		01 15 06-0111 Глазди строительные	т	0,001		0,0006			83 652,48		50,19		
		04 1 02 05 0008 Смесь бетонная тяжелого бетона (БСТ) класс В15 (М200)	м3	5,9		3,54			5 054,91		17 894,38		
		04 3 01 09-0014 Растер готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,06		0,036			4 611,20		166,00		
		11 1 03 06-0070 Доска обрезная хвойная порош., естественной влажности, длина 2,45 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II	м3	0,17		0,102			16 233,11		1 655,78		
		ФСБЦ-05 2 03 04-0008 Камни бортовые вибропрессованные тротуарные, размеры 1000x200x80 мм, светлые на сером цементе	шт	100		60			203,28		384,36		
2 1	ФСБЦ-05 2 03 04-0008 04-20- Периолаза грузок I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, асфальтобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстоянии 30 км					60					23 661,60		
2 1 1	ФСБЦ-05 2 03 04-0008 04-20- Периолаза грузок I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, асфальтобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстоянии 30 км					2,574			350,12	-1	-1 004,17		
2 1 2	ФСБЦ 05 2 03 04-0008 04-20- Периолаза грузок I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, асфальтобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстоянии 79 км					2,574			549,17		1 465,04		
<b>Всего по позиции</b>													
		<b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований, из песка</b>	100 м3	0,45	1	0,45					<b>81 580,95</b>		
3	ГЭСН27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований, из песка	100 м3	0,45	1	0,45							
		1 ОТ(ЗТ)	чел-ч	6,49		6,49					1 806,62		
		1-100-23 Средний разряд работы 2,3	чел-ч	14,4		6,48					1 806,62		
		2 ЭМ									14 156,37		
		ОТМ(ЗТм)	чел-ч	6,246		6,246					2 635,88		
		91 01 02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 89 кВт (135 л.с.)	маш.час	0,7965		0,7965					1 262,90		
		4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел-ч	1,77		0,7965			448,07		356,89		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91 06:05-011	Получение одношовные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,0 м <sup>3</sup> , грузоподъемность 5 т	маш.час	4,20		1,9006			1 652,88		3 161,10
	4-100-06-0	OTM(3TM) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	4,29		1,9306			383,35		740,04
	91 08 03-030	Катки самоходный пневмоколесный статический, масса 30 т	маш.час	7,08		3,188		2 391,80	2 917,75		9 286,95
	4-100-06-0	OTM(3TM) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	7,08		3,186			448,07		1 427,55
	91 13 01-038	Машины поликомбинные, вместимость цистерны 6 м <sup>3</sup>	маш.час	0,74		0,333		1 043,14	1 220,47		406,42
	4-100-040	OTM(3TM) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,74		0,333			333,57		111,08
		4 М									48,22
	01 7 03 01-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5		2,25		35,71	21,43		48,22
3 1	ФСБЦ-02.3.01.02-1104	Песок предельный для строительных работ I класса, средний	м <sup>3</sup>	100		45		1 129,74	1 129,74		50 838,30
3 1 1	ФСБЦ-02.3.01.02-1104.01-20	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью 1,01-0030 до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстояние 30 км	т			67,5			360,12	-1	-28 333,10
3 1 2	ФСБЦ-02.3.01.02-1104.01-20	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью 1,01-0079 до 20 т по дорогам с усовершенствованными (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстояние 78 км	т			67,5			569,17		38 418,98
4	ГЭСНЗТ-04.016-05	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: в "обойми"	1000 м <sup>2</sup>	0,225	1	0,225			209 007,89		94 053,55
		1 OT(3T)	чел.-ч			16,3125					4 547,93
		2 ЗМ	чел.-ч			16,3125					4 547,93
		OTM(3TM)	чел.-ч			1,71					750,74
	91 01 01-035	Бульдозер, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	5,88		1,323			1 444,72		1 444,72
	4-100-06-0	OTM(3TM) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	5,88		1,323			448,07		592,60
	91 01 02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,1		0,0225		1 259,64	1 585,56		35,88
	4-100-06-0	OTM(3TM) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,0225			448,07		10,08
	91 08 03-029	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т	маш.-ч	1,02		0,2295		2 160,26	2 672,12		613,25
	4-100-06-0	OTM(3TM) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,02		0,2295			448,07		102,63
	91 14 02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,6		0,135			557,37		75,24
	4-100-040	OTM(3TM) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,6		0,135			333,57		45,03
		4 М									6,38
	08 1 02 11-0001	Покраска из жидких красок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,00026		0,000585		55 693,16	108 001,45		6,38
	ФСБЦ-01.7.12.05-1014	Гололотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 450 г/м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	1100		247,5		13,73	61,25		15 159,38
4 1		Всего по позиции							166 767,02		37 522,58


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ГЭСН09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м, с погружением в бетонное основание/применительно монтажу оборудования	100 шт	0,28	1	0,28					
		1 OT(3T)	чел.-ч			9,9792					2 956,14
		2 ЗМ	чел.-ч			9,9792					2 956,14
		OTM(3TM)	чел.-ч			8,2544					2 401,66
	91 04 01-031	Машины буровые-пробные на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.час	10,93		3,0604			1 639,05		4 003,75
	4-100-05-0	OTM(3TM) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10,93		3,0604			368,36		1 173,20
	91 14 01-003	Автомобиль-носикители, объем барабана 6 м <sup>3</sup>	маш.час	10,74		3,0072			1 012,81		3 045,72
	4-100-05-0	OTM(3TM) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10,74		3,0072			383,35		1 152,81



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,81		0,2286			587,37		125,41
	4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,81		0,2286			583,57		75,65
	4 М										827,57
	1.1.03.01.0001 Бруски строительные хвойные пород (сосны, ели), размеры 50х50 мм, сорт АВ		м3	0,13975		0,03913	20 734,49	1,02	21 149,18		827,57
5.1	ФСБЦ.04.1.02.05.0006 Сетка бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)		м3	6,34		1,7752			5 054,31		6 973,48
5.1.1	ФСБЦ.04.1.02.05.0006_01-20- Перевозка грузов I класса автомобильными сортами грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими веществами) дорожным покрытием на расстоянии 30 км		т			4,2605			390,12	-1	-1 652,11
5.1.2	ФСБЦ.04.1.02.05.0006_01-20- Перевозка грузов I класса автомобильными сортами грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими веществами) дорожным покрытием на расстоянии 7,9 км		т			4,2605			569,17		2 424,55
5.2	ТЦ_15.2.00.00_50_590280787 Качалка балансир с сплнкой		шт	3,5714286		1			21 399,13		21 399,13
5.3	ТЦ_15.2.00.00_59_590909356 Горка игровая		шт	3,5714286		1			92 641,58		92 641,58
5.4	ТЦ_15.2.00.00_63_183214387 Качалка гнездо		шт	3,5714286		1			59 796,89		59 796,89
5.5	ТЦ_15.2.00.00_59_590909356 Пилонница с пружиной		шт	3,5714286		1			25 933,92		25 933,92
5.6	ТЦ_15.2.00.00_59_590909356 Качалка на пружине		шт	3,5714286		1			28 467,11		28 467,11
	Всего по позиции								933 009,96		261 242,79

Таблица

6	ГЭСН10-01-059-01	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др./применительно монтажа МАО (плавочки)	100 шт	0,02	1	0,02					
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч	1,354		1,354					377,50
	1-100.23 Средний разряд работы 2.3		чел.-ч	67,7		1,354			276,80		377,50
	2 ЭМ		чел.-ч								29,36
	ОТМ(3Тм)		чел.-ч	0,084		0,084					26,73
	91.05.06.046 Подъемники одноопалтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подвеса 45 м		маш.час	1,73		0,0346	37,32	1,42	52,99		1,83
	4-100-030 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	1,73		0,0346			296,23		10,25
	91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	2,47		0,0494			557,37		27,53
	4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	2,47		0,0494			333,57		16,48
	4 М										251,82
	01.15.06.0111 Газури строительные		т	0,012		0,0024	70 286,20	1,19	82 657,49		20,08
	09.1.02.11-0001 Поковки из легированных сталей 1,5-4,5 кг		т	0,035		0,0007	55 898,18	1,95	109 001,45		76,30
	11.2.07.12-0011 Шпалки (раскладки) деревянные, неокрашенные, сечением 19х19 мм		м	400		8	17,96	1,36	24,43		195,44
6.1	ТЦ_15.2.00.00_15_593306550 Скамья парковая		шт	100		2			5 639,72		11 959,44
	424_22.03.2024_02								569 187,50		13 383,75



Итого по смете:		Всего прямые затраты (справочно)	
	в том числе:		
	Оплата труда рабочих		427 481,73
	Эксплуатация машин		21 990,02
	Оплата труда машинистов (ОТм)		26 204,80
	Материалы		6 164,15
	Строительные работы		373 122,76
	в том числе:		469 096,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	оплата труда										21 990 02
	эксплуатация машин и механизмов										26 704,80
	оплата труда машинистов (Отм)										6 194,15
	материалы										379 122,76
	—кладовые расходы										38 232,84
	сметная прибыль										33 384,62
	Всего ФХТ (справочно)										28 154,17
	Всего накладные расходы (справочно)										38 232,84
	Всего сметная прибыль (справочно)										33 384,62
	НДС 20%										99 819,84
	<b>ВСЕГО по смете</b>					76 0057					<b>598 919,03</b>
	<b>Справочно</b>					15 1204					
	затраты труда рабочих										
	затраты труда машинистов										

Составил: \_\_\_\_\_  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]  
 Д.Н. Круглов

Принял: \_\_\_\_\_  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г. регистрационный № 5586(Ф), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 августа 2021 г. регистрационный № 64577) «Ф».

Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

